

ОБЕКТ

**Улична дъждовна канализация за отводняване на
УПИ I Спорт, Атракции, Озеленяване и Рекреация , кв. 334а,
УПИ IX-7152 за православен храм и УПИ VI-7153 за Парк- Спорт, Атракции,
Озеленяване и Рекреация , кв. 326а,
по улица от О.Т.4694 до О.Т.4672 и от О.Т.4672 до О.Т.4674
ПО ПЛАНА НА ГР.СТАРА ЗАГОРА**

ФАЗА
РАБОТЕН ПРОЕКТЧАСТ
ВРЕМЕННА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕ

Възложител:.....
/Община Стара Загора/



Проектант:

Водещ проектант:.....
/ инж. Васил Тодоров /Изпълнителен директор:.....
/арх. Петър Диков/



УДОСТОВЕРЕНИЕ

ЗА ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ

Регистрационен номер № 06707

Важи за 2016 година

инж. МАРИЯНА ГЕНЧЕВА ИВАНОВА

ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН

МАГИСТЪР

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

СТРОИТЕЛЕН ИНЖЕНЕР ПО ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО

включен в регистъра на КИИП за лицата с пълна проектантска правоспособност
с протоколно решение на УС на КИИП 11/03.12.2004 г. по части:

КОНСТРУКТИВНА НА ТРАНСПОРТНИ СЪОРЪЖЕНИЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ И БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО

Председател на РК

инж. С. Колев

Председател на КР

инж. И. Каракеев



Председател на УС на КИИП

инж. Ст. Кинарев

2016

Съдържание текстова част:

No	ИМЕ НА ДОКУМЕНТ	ИМЕ НА PDF ФАЙЛ	ИМЕ НА ФАЙЛ
1	Обяснителна записка	Zap_R_vast_nast_St.zag	Zap_R_vast_nast_St.zag.doc

Съдържание графична част:

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

ОСНОВАНИЕ И ЦЕЛ НА ПРОЕКТА

Настоящият проект третира временната организация за обект: „Изграждане на улична дъждовна канализация за отводняване на УПИ I, кв. 334 а, УПИ IX - 7152 и УПИ IV-7153, кв. 326 а, по улица от О.Т. 4694 до О.Т. 4672 и от О.Т. 4672 до О.Т. 4674, по плана на гр.Стара Загора”, съгласно допълнително задание на Община Стара Загора на база на предварителен договор № 109 между „Водоснабдяване и Канализация“ ЕОО - Стара Загора и Община Стара Загора с цел пресъединяване на отпадни дъждовни води от обект „ПАРКОУСТРОЯВАНЕ И БЛАГОУСТРОЯВАНЕ на УПИ VI – МО - военен терен по плана на гр. Стара Загора.

Целта на разработката е да се проектира дъждовна канализация от новопроектирания обект „ПАРКОУСТРОЯВАНЕ И БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА УПИ VI-3346, КВ. 326 а, ПО ПЛАНА НА ГР.СТАРА ЗАГОРА“ до оказана от „Водоснабдяване и Канализация“ ЕОО - Стара Загора съществуваща РШ с канализация ф400 мм бетон по бул „Славянски“.

ВРЕМЕННА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕ ПО ВРЕМЕ НА СМР

Временната организация на движение се отнася за времето на строителство при изграждане на улична дъждовна канализация от новопроектирания парк, по улица в ж.к Казански, през зелени площи и пресичаща едното платно на бул. Славянски и свързваща се в съществуваща ревизионна шахта в разделителя на булеварда.

По ул. ж.к Казански се движат градски транспорт. Поради ремонтните работи по цялата ширина на улицата се налага неговото изместяване. С Дирекция Транспорт, към Община Стара Загора се проведоха разговори. Те се съгласиха с изместяването на трасето на движещите се автобуси по улицата и тяхното искане е 10 дни преди започване на строително монтажните работи да се внесе в общината заявление от строителя, за да могат да организират своевременното информиране на гражданите и обозначат новия маршрут и новите спирки.

Временната организация е решена в пет етапа.

Първи етап е цялостно затваряна на улицата за движение на превозни средства, с работна дължина 69,0м. Движението се отбито по обходен маршрут по улиците на квартала.

Втори етап е цялостно затваряна на следващата част на улицата за движение на превозни средства, с работна дължина 145,0м. Движението се отбито по обходен маршрут по улиците на квартала.

Трети етап е цялостно затваряна на следващата част на улицата за движение на превозни средства, с работна дължина 105,0м. Движението се отбито по обходен маршрут по улиците на квартала.

Етапноста е съобразена с отбивките за влизане в междублоковите пространства и създаване на по-малки неудобства за живущите в квартала.

Четвърти и пети етап са при пресичане на едното платно за движение по бул. Славянски. Ширината на платното е с ширина 7,50м с две ленти за движение. Първо се затваря едната лента и движението се пренасочва в другата и на следващия етап обратно. Дължините на работните участъци са 22,0м и няма да доведат до големи затруднения на водачите.

Временната организация на движение се състои от преносими стандартни табели и бариери (напреко на улицата), ограждащи работния участък. Бариерите са снабдени с ел. лампи с ж.м.с. за нощно време.

Всички временни пътни знаци се поставят на съответните места и разстояния съгласно схемата.

Времето, необходимо за всяко отделно СМР е около ... денонощия.

Необходимо е всички временни пътни знаци да са стандартни, светлоотразяващи, I –ви типоразмер, да са поставени стабилно (срещу обръщане от вятър или удар) и на видно място, като височината на долния пътен знак да е 2.20м от терена.

След приключване на работа е задължително демонтирането на всички временни пътни знаци и прибирането им.

Проектът за ВОД е изпълнен съгласно изискванията на Наредба №3 от 16.08.2010г за временна организация и безопасността на движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците.



Съгл. заповед: 10-00-1896/17.08.2016г.
инж. Димитър Ропав
Главен специалист отддел „ИУП“



Забележки:

1. Затваряне на едното платно от бул. Славянски с Дължина 22м. Пренасочване на движението в другата лента.
2. Напречно ограждане с бариери C4.1 и C4.2
3. Осветлението на работния участък е от ел. лампи с мигаща жълта светлина за нощна сигнализация.

ВОД важи задни, с-но етапността на Календарния график на строителство.

При изкопните работи да се внимава за подземни комуникации. Желателно е да присъстват представители на съответните служби.

ВОД да се съгласува с контролните органи преди етапа на строителство.



Институт за градско планиране			
www.iup.bg office @iup.bg			
гр. София, ул. Кораб планина 8-10, офис 3			
ОБЕКТ	ИГРАЖДАНЕ НА УЛ. ДЪЖДОВНА КАНАЛИЗАЦИЯ ЗА ОТВОДНЯВАНЕ НА УПИ I, кв.334а, УПИ IX-7152 и УПИ IV-7153, кв.326а по улица от О.Т.4694 до О.Т.4672 и от О.Т.4672 до О.Т.4674 по плана на гр.СТАРА ЗАГОРА		
ВЪЗЛОЖИТЕЛ	Община СТАРА ЗАГОРА		
ЧАСТ	ВРЕМЕННА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО	ФАЗА	РАБОТЕН ПРОЕКТ
ЧЕРТЕЖ	ВОД при изграждане на ул. дъждовна канализация V -ти ЕТАП		
МАЩАБ	M 1:500		
ПРОЕКТАНТ	инж. Марияна Иванова		
ВОД			
ПРОЕКТАНТСКИ ЕКИП:			
ГЕОДЕЗИЯ	инж. Николай Тончев	ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ	инж. Евгений Манолов
ПБЗ / ПУСО	инж. Илиана Малезанова		
СТР. КОНСТРУКЦИИ	инж. Евгений Манолов		
ПЪТНА	инж. Марияна Иванова		
ВИК	инж. Веселин Тодоров		
ВОДЕЩ ПРОЕКТАНТ	инж. Васил Тодоров	ОБЕКТ	ЛИСТ №
ИЗП. ДИРЕКТОР	арх. Петър Диков	2016_STZ_RDRAIN	A1
		ИМЕ НА ФАЙЛА	ИМЕ НА ЧЕРТЕЖА
		SZ_VOD_W_05.dwg	STZ_Park_W_VOD_5
		ДАТА	12.2016



Забележки:

1. Затваряне на едното платно от бул. Славянски с Дължина 22м.
Пренасочване на движението в другата лента.
2. Напречно ограждане с бариери C4.1 и C4.2
3. Осветлението на работния участък е от ел. лампи с мигаща
жълтата светлина за нощна сигнализация.


ВОД важи задни, с-но етапността на Календарния график на строителство.


При изкопните работи да се внимава за подземни комуникации. Желателно е да присъстват представители на съответните служби.

ВОД да се съгласува с контролните органи преди етапа на строителство.



Институт за градско планиране						
www.iup.bg office@iup.bg						
гр. София, ул. Кораб планина 8-10, офис 3						
ОБЕКТ	ИЗГРАЖДАНЕ НА УЛ. ДЪждовна канализация за отводняване на УПИ I, кв.334а, УПИ IX-7152 и УПИ IV-7153, кв.326а по улица от О.Т.4694 до О.Т.4672 и от О.Т.4672 до О.Т.4674 по плана на гр.СТАРА ЗАГОРА					
ВЪЗЛОЖИТЕЛ	Община СТАРА ЗАГОРА	ЧАСТ	ВРЕМЕННА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО			
ЧЕРТЕЖ	ВОД при изграждане на ул. дъждовна канализация					
ПРОЕКТАНТ	IV -ти ЕТАП					
ВОД	инж. Марияна Иванова					
МАЩАБ M 1:500						
ПРОЕКТАНТСКИ ЕКИП:						
ГЕОДЕЗИЯ	инж. Николай Тончев	ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ	инж. Евгений Манолов			
ПБЗ /ПУСО	инж. Илиана Малезанова					
СТР. КОНСТРУКЦИИ	инж. Евгений Манолов					
ПЪТНА	инж. Марияна Иванова					
ВИК	инж. Васил Георгиев					
ВОДЕЩ ПРОЕКТАНТ	инж. Варил Тодоров	ОБЕКТ	ЛИСТ №			
ИЗП. ДИРЕКТОР	арх. Петър Диков	2016_STZ_RDRAIN	A1			
		ИМЕ НА ФАЙЛА	ИМЕ НА ЧЕРТЕЖА			
		SZ_VOD_W_04.dwg	STZ_Park_W_VOD_4			
		DATA	12.2016			

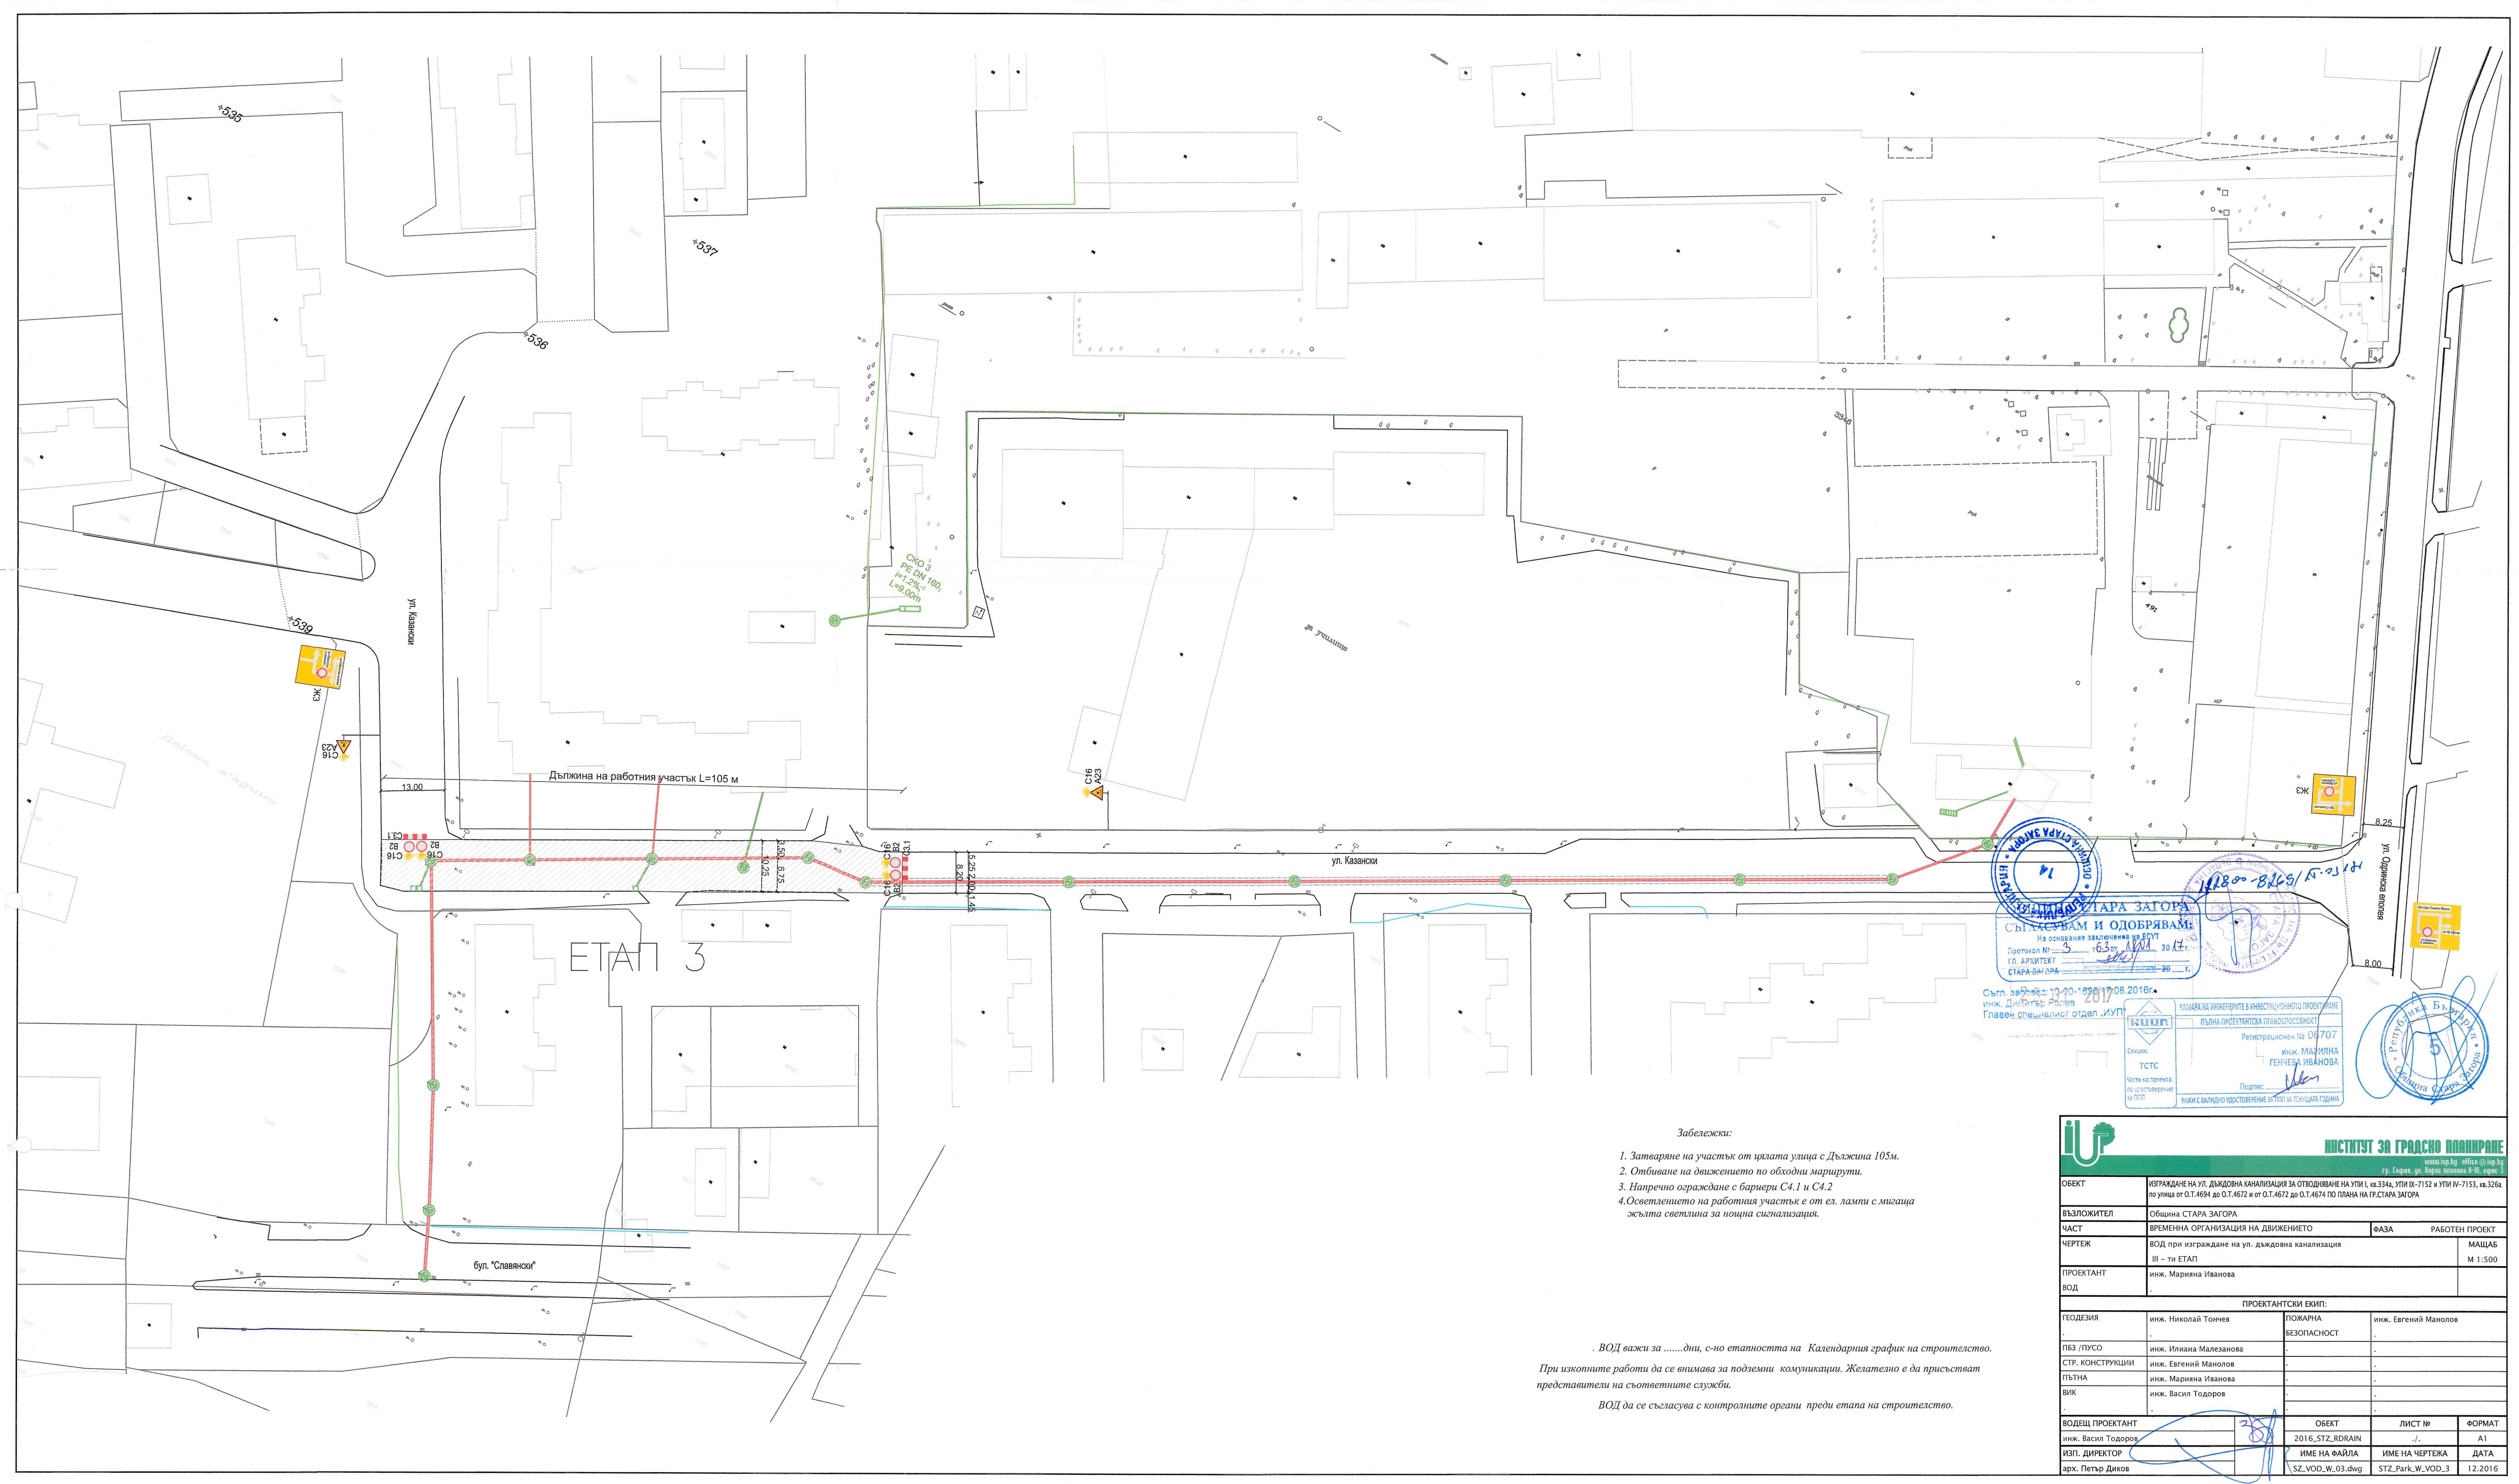

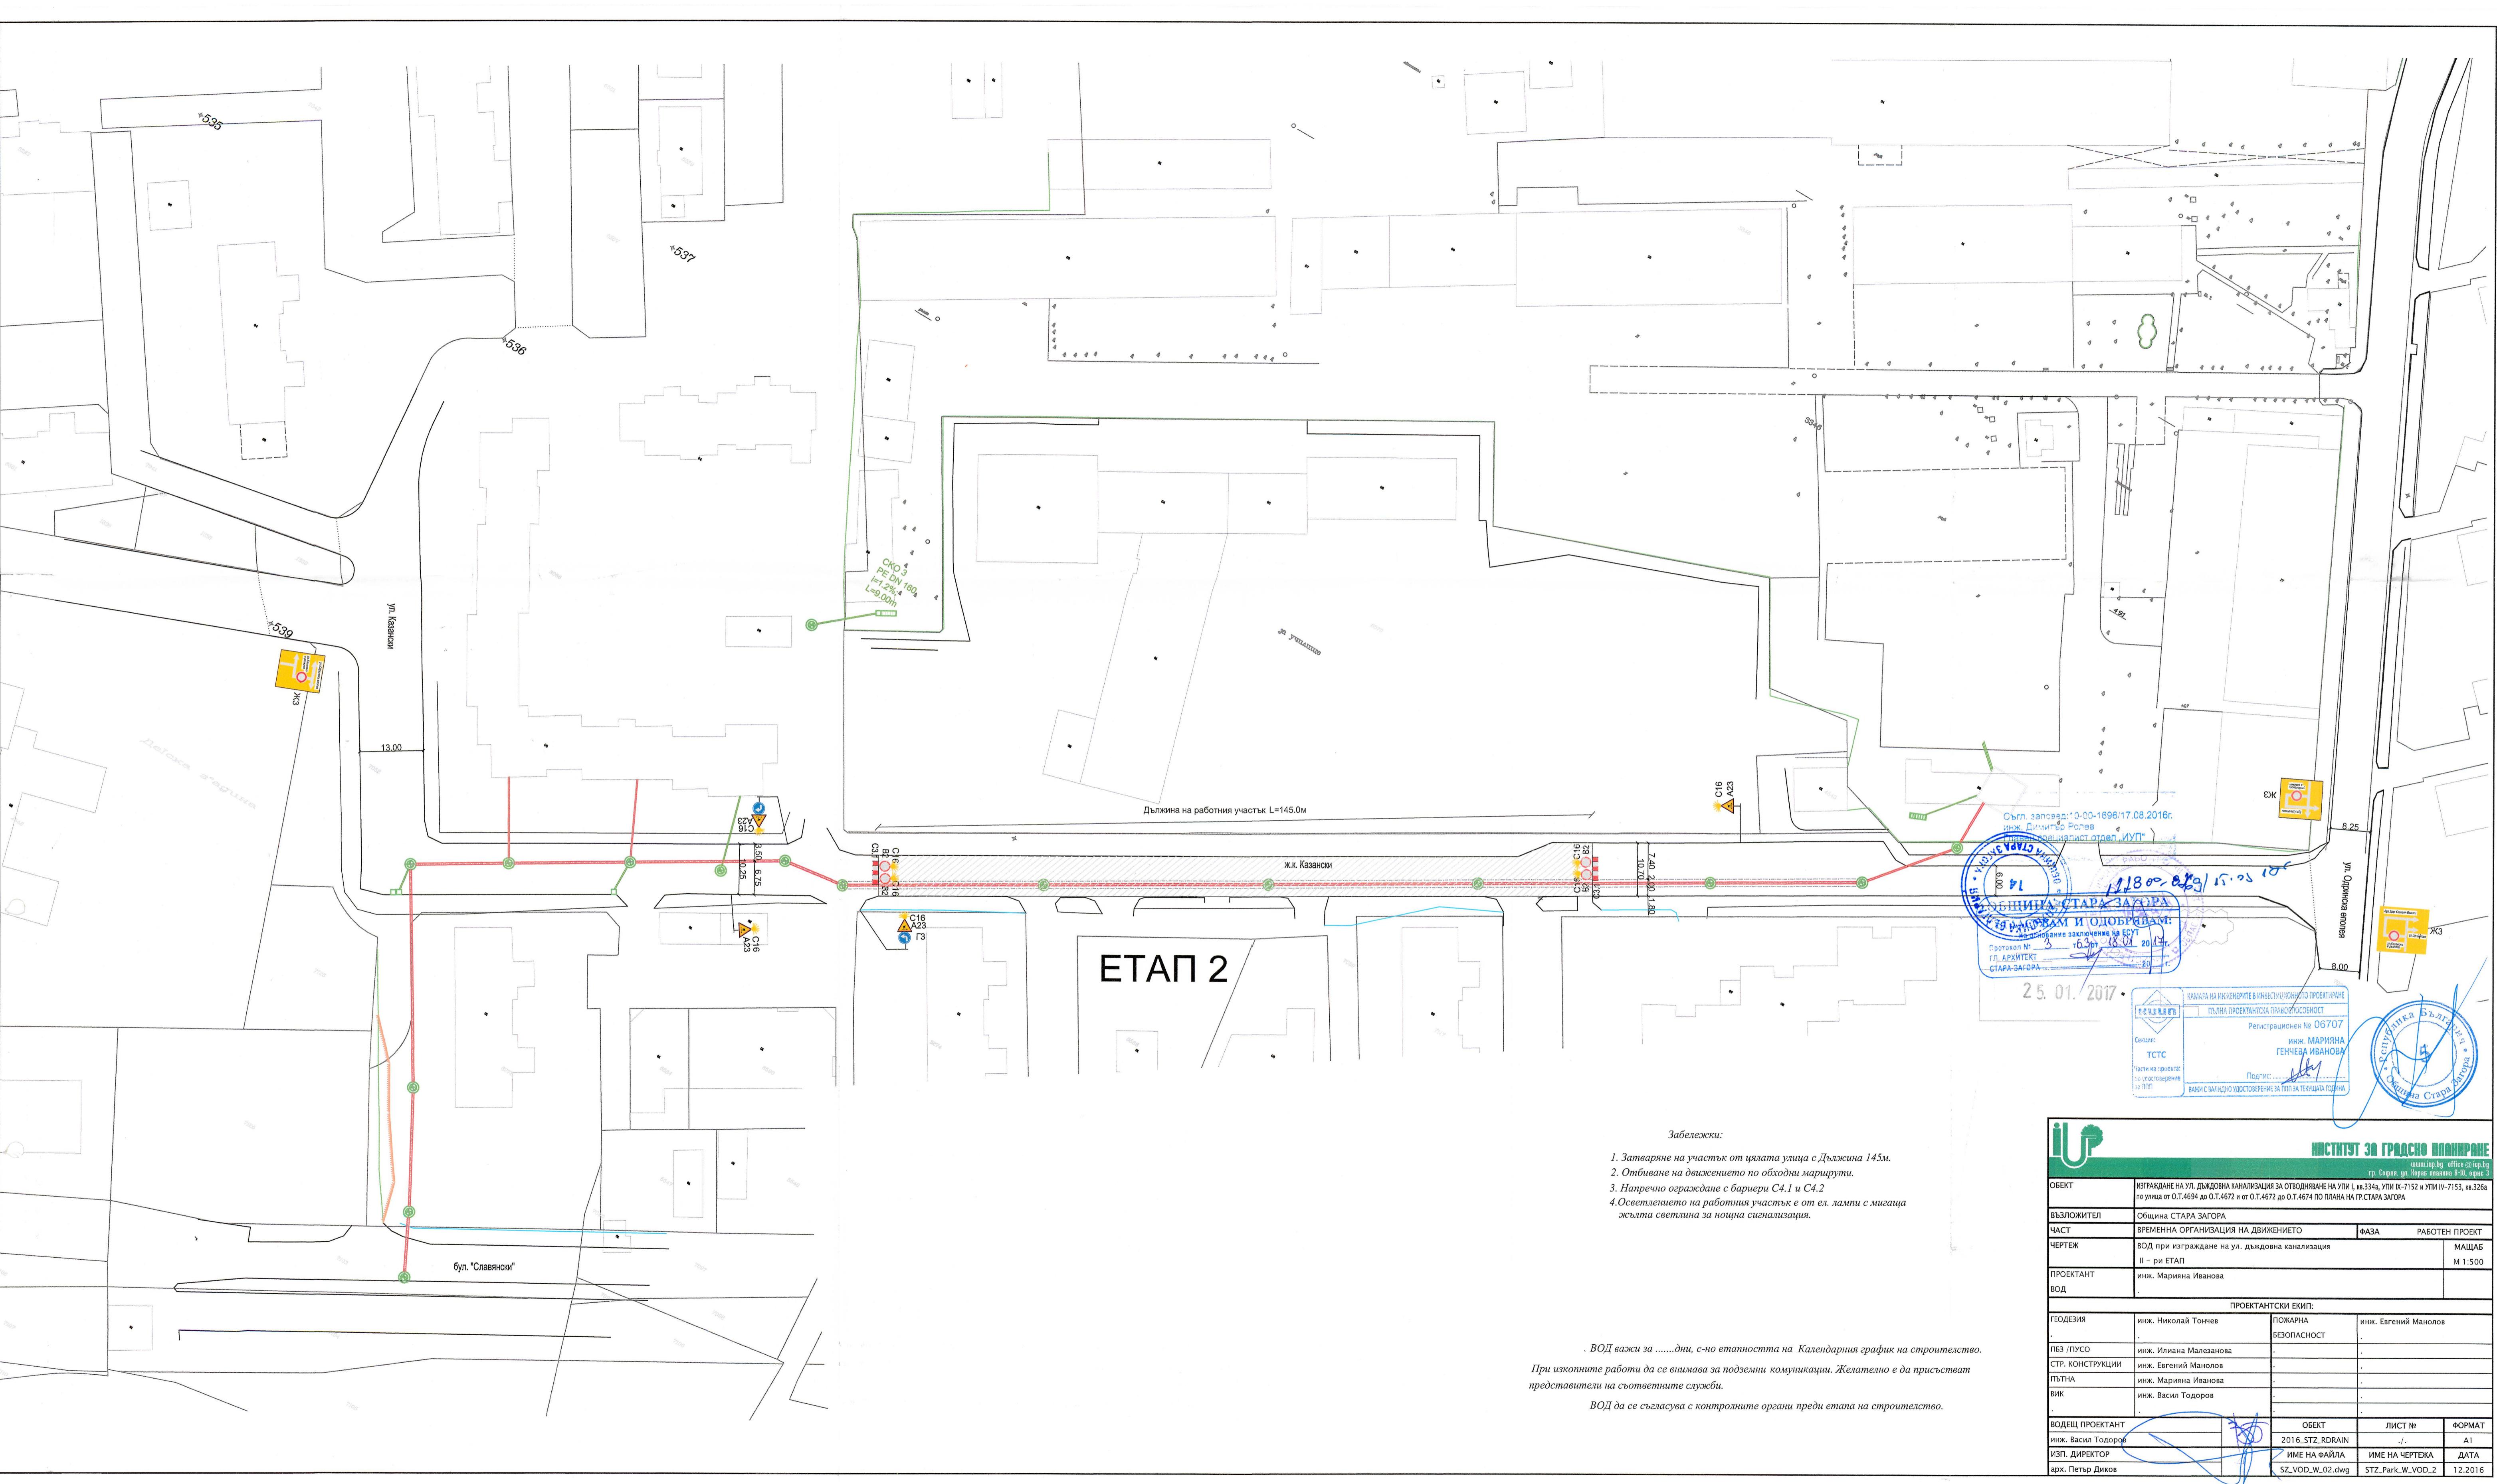

ЕТАП 1

Забележки:

1. Затваряне на участък от цялата улица с Дължина 69м.
2. Отбиване на движението по обходни маршрути.
3. Напречно ограждане с бариери C4.1 и C4.2
4. Осветлението на работния участък е от ел. лампи с мигаща жълта светлина за нощна сигнализация.

ВОД важи задни, с-но етапността на Календарния график на строителство.

При изконните работи да се внимава за подземни комуникации. Желателно е да присъстват представители на съответните служби.

ВОД да се съгласува с контролните органи преди етапа на строителство.

Институт за градско планиране			
www.ipg.bg office@ipg.bg			
г. София, ул. Царев мост 8-III, кв.326а			
ОБЕКТ	ИЗГРАДНЕ НА УЛ. ДЪЙДОВНА КАНАЛИЗАЦИЯ ЗА ОТВОДЛЕВАНЕ НА УЛИЧНА ВОДА ОТ УЛИЦА ИХ-7152 И УЛИЦА ИУП-IV-7153, КВ.334а, УЛИЦА ИХ-7152 И УЛИЦА ИУП-IV-7153, КВ.326а		
ВЪЗЛОЖИТЕЛ	Община СТАРА ЗАГОРА		
ЧАСТ	ВРЕМЕННА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО		
ЧЕРТЕЖ	ВОД при изграждане на ул. дъждовна канализация	ФАЗА	РАБОТЕН ПРОЕКТ
ПРОЕКТАНТ	инж. Марияна Иванова		
ВОД	МАСКАБ M 1:500		
ПРОЕКТАНТСКИ ЕКИП:			
ГЕОДЕЗИЯ	инж. Николай Тончев	ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ	инж. Евгений Манолов
ПБЗ / ПУСО	инж. Илиана Малезанова		
СТР. КОНСТРУКЦИИ	инж. Евгений Манолов		
ПЪТНА	инж. Марияна Иванова		
ВИК	инж. Васил Тодоров		
ВОДЕЩ ПРОЕКТАНТ	ОБЕКТ		
инж. Васил Тодоров	ЛИСТ №		
изп. ДИРЕКТОР	A1		
арх. Петър Диков	ИМЕ НА ФАЙЛА	ИМЕ НА ЧЕРТЕЖА	ДАТА
	SZ_VOD_W_01.dwg	STZ_Park_W_VOD_1	12.2016

