ЛИНЕЕН КАЛЕНДАРЕН ПЛАН-Г
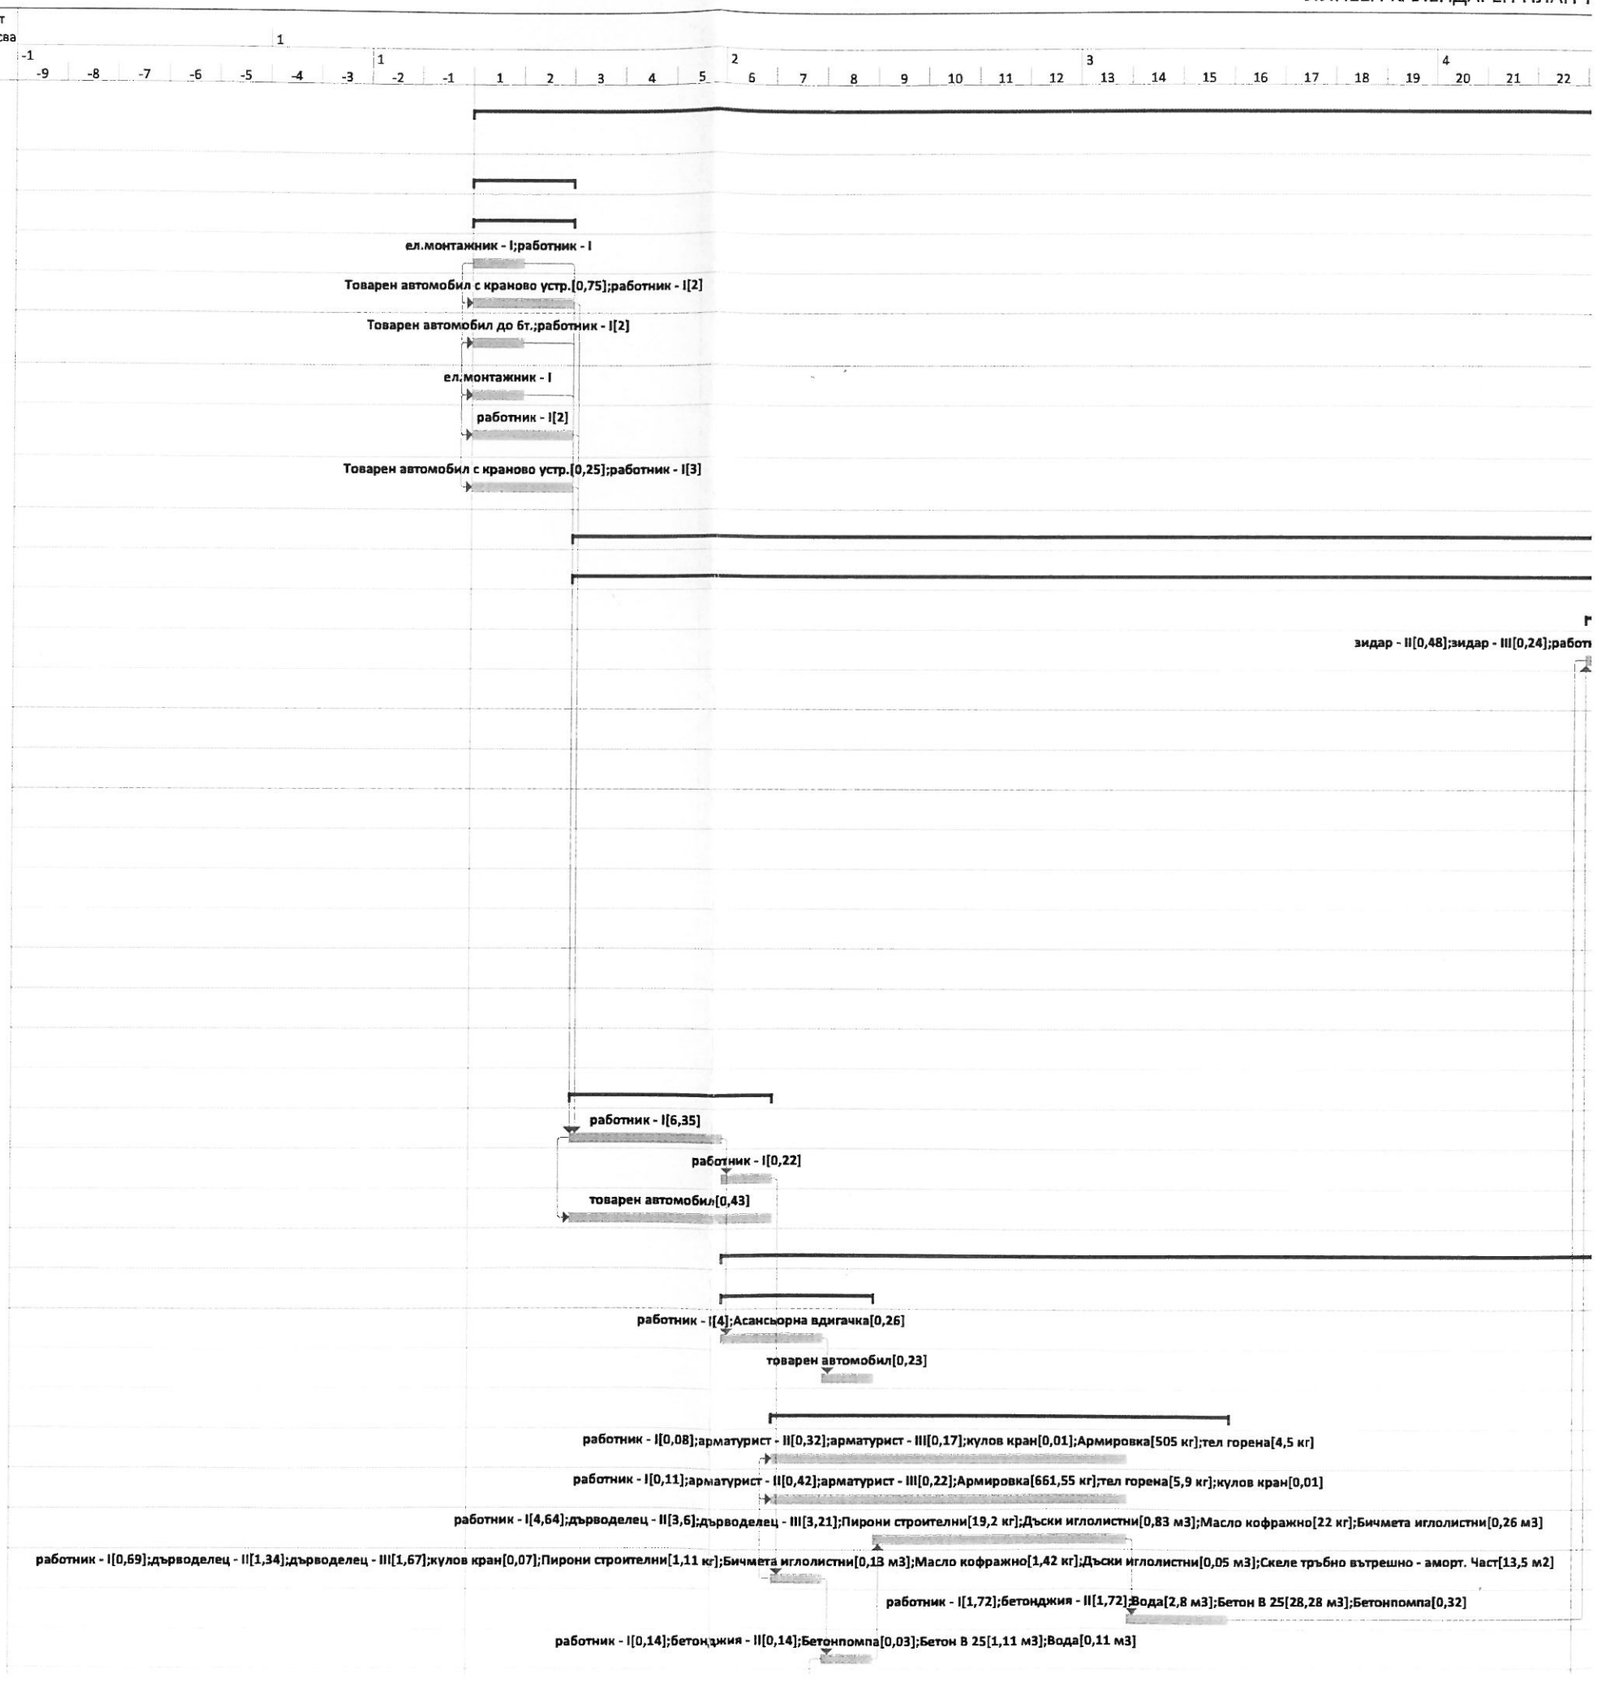
ID	Позиция	Ед.мярк	Количество	Производит	Продължит	Начало от подписван на акт обр.2а	Край от подписва на акт обр.2а
1	**Извършване на строително-монтажни работи на обект – „Авариен текущ ремонт на покрива на промишлена сграда /гаражи/ с идентификатор 68850.513.564.3 в УПИ VII-общински, кв.133 по плана на гр.Стара Загора“**		**0**	**0**	**60 days**	**1**	**60**
2	**ЕТАП 1 - Подготвителни работи и временно строителство**		**0**	**0**	**2 days**	**1**	**2**
3	**Разчистване на строителната площадка и изграждане на временно строително селище в т.ч.:**		**0**	**0**	**2 days**	**1**	**2**
4	ВРЕМЕННО ЕЛ. ЗАХРАНВАНЕ		0	0	1 day	1	1
5	ИНВЕНТАРЕН СТРОИТЕЛЕН ФУРГОН И ФУРГОНИ ЗА ПОЧИВКА НА РАБОТЕЩИТЕ		0	0	2 days	1	2
6	ВРЕМЕННА СИГНАЛИЗАЦИЯ, ЗНАЦИ, ТАБЕЛИ И БАРИЕРИ СЪГЛ. ПБЗ, ВОБД И НАРЕДБА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР		0	0	1 day	1	1
7	ОБЕЗОПАСЯВАНЕ НА КОМУНИКАЦИИ		0	0	1 day	1	1
8	ОБОСОБЯВАНЕ НА ЗОНИ ЗА СКЛАДОВЕ, ПАРКИНГ НА МЕХАНИЗАЦИЯ, САНИТАРНИ ЗОНИ И ЗОНИ ЗА ПОЖАРОГАСИТЕЛИ И БЪРЗА ПОМОЩ		0	0	2 days	1	2
9	КОНТЕЙНЕР ЗА ОТПАДЪЦИ И ОГРАДА НА СЕЛИЩЕТО		0	0	2 days	1	2
10	**ЕТАП 2 - Строителни дейности**		**0**	**0**	**54 days**	**3**	**56**
11	**Част Архитектура**		**0**	**0**	**51 days**	**3**	**53**
12	**Част Архитектурна / Стени**		**0**	**0**	**31 days**	**23**	**53**
13	ТУХЛЕНА ЗИДАРИЯ 25 СМ ОТ КУХИ ТУХЛИ НА ВЦ РАЗТВОР	м3	5	1	5 days	23	27
14	ВАРОЦИМЕНТОВА МАЗИЛКА ПО СТЕНИ / БОРДОВЕ	м2	186	46,5	4 days	40	43
15	БОЯДИСВАНЕ С ЛАТЕКС ПО СТЕНИ И ТАВАНИ , ДВУКРАТНО /ВКЛ. ГРУНД/	м2	8	4	2 days	52	53
16	ФАСАДНА БОЯ ПО БОРДОВЕ /ВКЛ. ГРУНД/	м2	178	44,5	4 days	48	51
17	**Част Архитектурна / Покрив**		**0**	**0**	**20 days**	**34**	**53**
18	ТРИСЛОЕН ПОКРИВЕН ТОПЛОИЗОЛАЦИОНЕН ПАНЕЛ - 10 СМ	м2	277	46,17	6 days	34	39
19	ВИСЯЩИ ОЛУЦИ ОТ ЛАМАРИНА С PVC ПОКРИТИЕ	м	19	19	1 day	52	52
20	СЕДЯЩИ ОЛУЦИ ОТ ЛАМАРИНА С PVC ПОКРИТИЕ	м	10	10	1 day	53	53
21	ВОДОСТОЧНИ ТРЪБИ ОТ ЛАМАРИНА С PVC ПОКРИТИЕ	м	8	8	1 day	53	53
22	ВОДОСТОЧНИ КАЗАНЧЕТА	бр	2	2	1 day	53	53
23	ОБШИВКА НА БОРДОВЕ И ДР ОТ ЛАМАРИНА С PVC ПОКРИТИЕ	м2	60	15	4 days	44	47
24	**Част Архитектурна / Други**		**0**	**4,3**	**4 days**	**3**	**6**
25	РАЗРУПАВАНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩ ПОКРИВ	м2	340	113,33	3 days	3	5
26	ДЕМОНТАЖ ВРАТА	бр	1	1	1 day	6	6
27	ПРЕВОЗ СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ	м3	68	17	4 days	3	6
28	**Част Строителни конструкции**		**0**	**0**	**28 days**	**6**	**33**
29	**Част Строителни конструкции / Демонтажни работи**		**0**	**0**	**3 days**	**6**	**8**
30	РАЗВАЛЯНЕ ДЪРВЕНА ПОКРИВНА КОНСТРУКЦИЯ	м3	9	4,5	2 days	6	7
31	ИЗВОЗВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ	м3	9	9	1 day	8	8
32	**Част Строителни конструкции / Кофражни, армировъчни и бетонови работи**		**0**	**0**	**9 days**	**7**	**15**
33	АРМИРОВКА А-I	кг	500	71,43	7 days	7	13
34	АРМИРОВКА А-III	кг	655	93,57	7 days	7	13
35	КОФРАЖ ЗА СТОМАНОБЕТОНОВИ ПОЯСИ И ГРЕДА	м2	176	35,2	5 days	9	13
36	КОФРАЖ ЗА СТОМАНОБЕТОНОВИ КОЛОНИ	м2	13,5	13,5	1 day	7	7
37	БЕТОН ЗА СТОМАНОБЕТОНОВИ ПОЯСИ И ГРЕДА В25	м3	28	14	2 days	14	15
38	БЕТОН ЗА КОЛОНИ В25	м3	1,1	1,1	1 day	8	8
39	ПРЕВОЗ НА БЕТОН ДО ОБЕКТА	м3	29,1	9,7	3 days	8	15
